

## 取手グリーンスポーツセンター第1体育室床補強工事について

## 【経過報告】

平成29年度	「第1・第2体育室床改修工事」を実施。
令和元年度	「バスケットボール用ゴール入替」を実施。 (令和元年9月納入) (契約額：19,872,000円(4台分))
	令和2年2月に、ゴール保管場所前面の床のたわみを確認。
令和2年度	6月に歪み部分の拡大を確認。
	12月議会に床補強工事实施設計を計上。承認後、年度内の工期とし設計業務を実施。(契約額：495,000円)
令和3年度	実施設計を受け、公共施設整備課において工事費を算出。6月議会に補正予算の計上。(補正額：43,100,000円)

## 【床補強実施設計について】

平成29年度に行った床改修工事では、ゴール設置場所のみの補強であったが、それ以外の場所に損傷が生じたことから、ゴールの移動部分(設置場所までのルート)についても補強を行うこととした。また設置場所についても、現在のゴールの荷重に対する床の耐荷重を検討し、これまで以上に強度を持たせる内容の設計を行った。

また、ゴールの格納場所については、他の部分よりも負荷がかかることから、より一層の強度を持たせるため、コンクリート床にすることとした。

※ 補強部分、鋼製床の詳細については別紙参照。



## 【今後の対応】

補正予算の承認後、契約事務手続き(7月指名委員会)を行い工事を実施予定。



全体の工期としては令和4年2月末程度とするが、これは表層部分の屋内スポーツ用長尺塩ビシート(納期が4ヶ月～5ヶ月かかる見込みであるため)であり、実際の現場施工期間は約1か月半程度と考えており、早くとも11月以降の工事着工となると思われる。

第1体育室のみ約1ヶ月間の閉鎖により改修工事を行う予定とし、閉鎖期間中の補填等については、指定管理者との協議により進めていくものとする。

【現況】

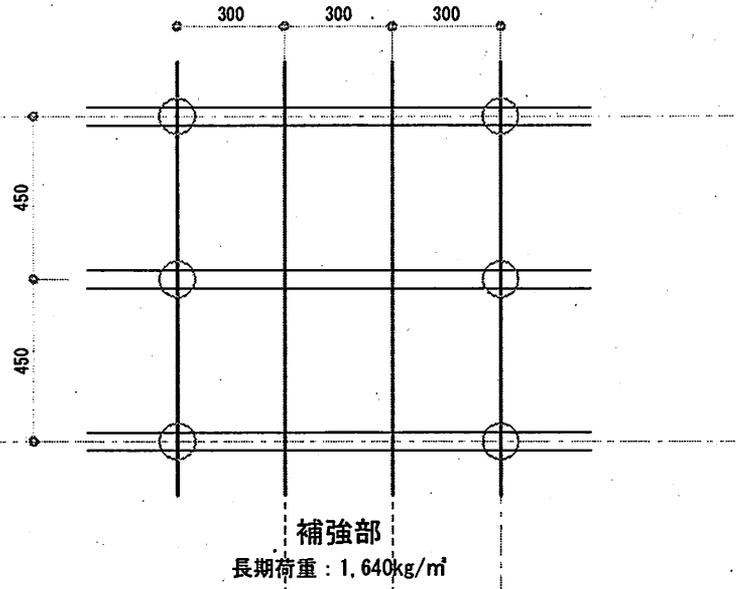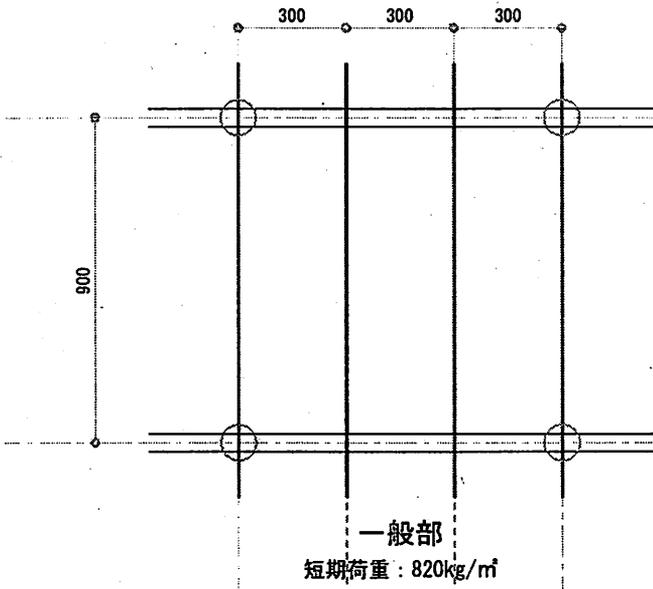

【設計】

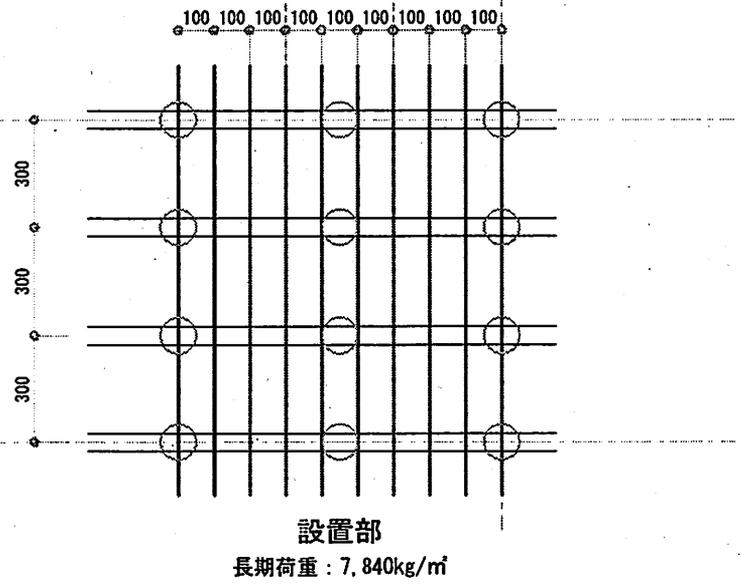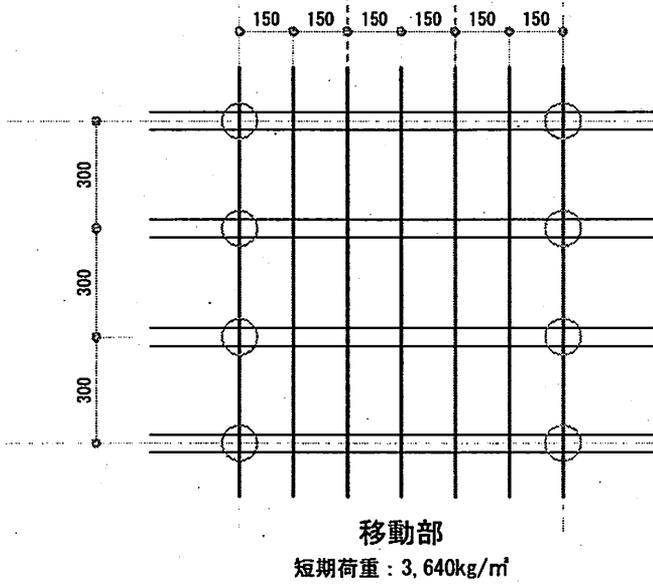



取教委発第 529 号  
令和 3 年 6 月 18 日

取手市議会議長  
齋藤久代 殿

取手市教育委員会  
教育長 伊藤 哲

資料の交付について

令和 3 年 6 月 17 日付け、取議発第 20 号で請求があった資料につきまして、別添のとおり請求関係書類の写しを交付いたします。

取手グリーンスポーツセンターバスケットボール用ゴール購入仕様書

項目	品番	品名	数量	
1	DA066600	セノー オレンジゴール	2	対
2	DA060004	セノー セッティングゲージ	2	対
3		送料	1	式
4		搬入・組立費	1	式
5		処分費	1	式

※ 納期:平成31年9月30日

※ 同等品で見積もる場合はスポーツ生涯学習課と協議のこと。

令和3年6月24日

取手市議会議長  
齋藤久 代 殿

取手市長 藤井信吾

## 資料の提出について

令和3年第2回定例会一般会計決算・予算審査特別委員会において要請のあった資料につきまして、下記のとおり提出いたします。

## 記

## ○ 取手グリーンスポーツセンター第1体育室床損傷に関する事案検証スケジュール

日 時	内 容
令和3年7月1日	第1回 事案検証会議 ①事実経過の再確認 ②原因の究明方法の検討 ③体育館床専門機関への調査照会
令和3年7月中旬 から8月上旬	床改修工事实施設設計・工事検証 ①関係職員及び関係業者への聞き取り調査 ②設計及び施工方法の妥当性・課題の調査
	バスケットボールゴール購入検証 ①関係職員及び業者への聞き取り調査 ②備品選定の妥当性・課題の調査
令和3年8月中旬	第2回 事案検証会議（複数回の開催を予定） ①体育館床専門機関への照会結果の確認 ②検証結果確認及び再発防止策の整理
令和3年8月下旬	検証結果の議会への報告
